

Единая система управления, структурирование технических процессов и применение передовых методов проектирования при реализации объектов транспортной инфраструктуры

Баженов Владимир Анатольевич
заместитель главного инженера по реализации
технической политики компании «ВТМ дорпроект»

НАШИ ПОБЕДЫ



1. Регламентированные процессы
2. Единая система управления
3. Информационное моделирование
4. Автоматизация
5. Центр интеллектуальных компетенций

Организационная структура проекта

1

- Куратор объекта

2

- Менеджер объекта

3

- Специалист по управлению проектами

4

- Комплексный главный инженер проекта

5

- Начальник структурного подразделения

6

- Главный инженер проекта по отдельному направлению

7

- Специалисты организации - разработчики


8

- Специалисты, осуществляющие проверку результатов работы

КОРПОРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

1. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА	
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ	<ul style="list-style-type: none"> Оценка необходимости участия в конкурсе или выполнения коммерческого заказа Подписание приказа о назначении менеджера объекта и комплексного главного инженера проекта для подготовки коммерческого (конкурсного) предложения. Проведение установочного совещания по проекту.
СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ	<ul style="list-style-type: none"> Оформление проекта приказа о назначении менеджера и комплексного главного инженера проекта для выполнения предпроектных работ. Организация установочного совещания по объекту.
МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА	<ul style="list-style-type: none"> Получение исходных данных от Заказчика. Формирование команды специалистов с целью изучения задания, определения объемов и сроков выполнения работ, подготовки заявки на участие в конкурсе. Контроль оформления предпроектных предложений по итогам обследования территории предполагаемого строительства.
КОМПЛЕКСНЫЙ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	<ul style="list-style-type: none"> Выезд на объект. Подготовка предпроектных предложений по итогам обследования территории предполагаемого строительства.
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА	
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ	<ul style="list-style-type: none"> Подписание приказа о назначении менеджера объекта, комплексного главного инженера проекта, комплексного главного инженера проекта по инженерным коммуникациям, специалиста по формированию сводного проекта организации строительства, спикера по объекту. Утверждение объектного графика выполнения работ и протокола распределения денежных средств.
СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ	<ul style="list-style-type: none"> Оформление проекта приказа. Проверка объектного графика выполнения работ и протокола распределения денежных средств.
НАЧАЛЬНИКИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	<ul style="list-style-type: none"> Согласование объектного графика выполнения работ. Включение проекта в план выполнения работ.

Структурирование и описание процессов

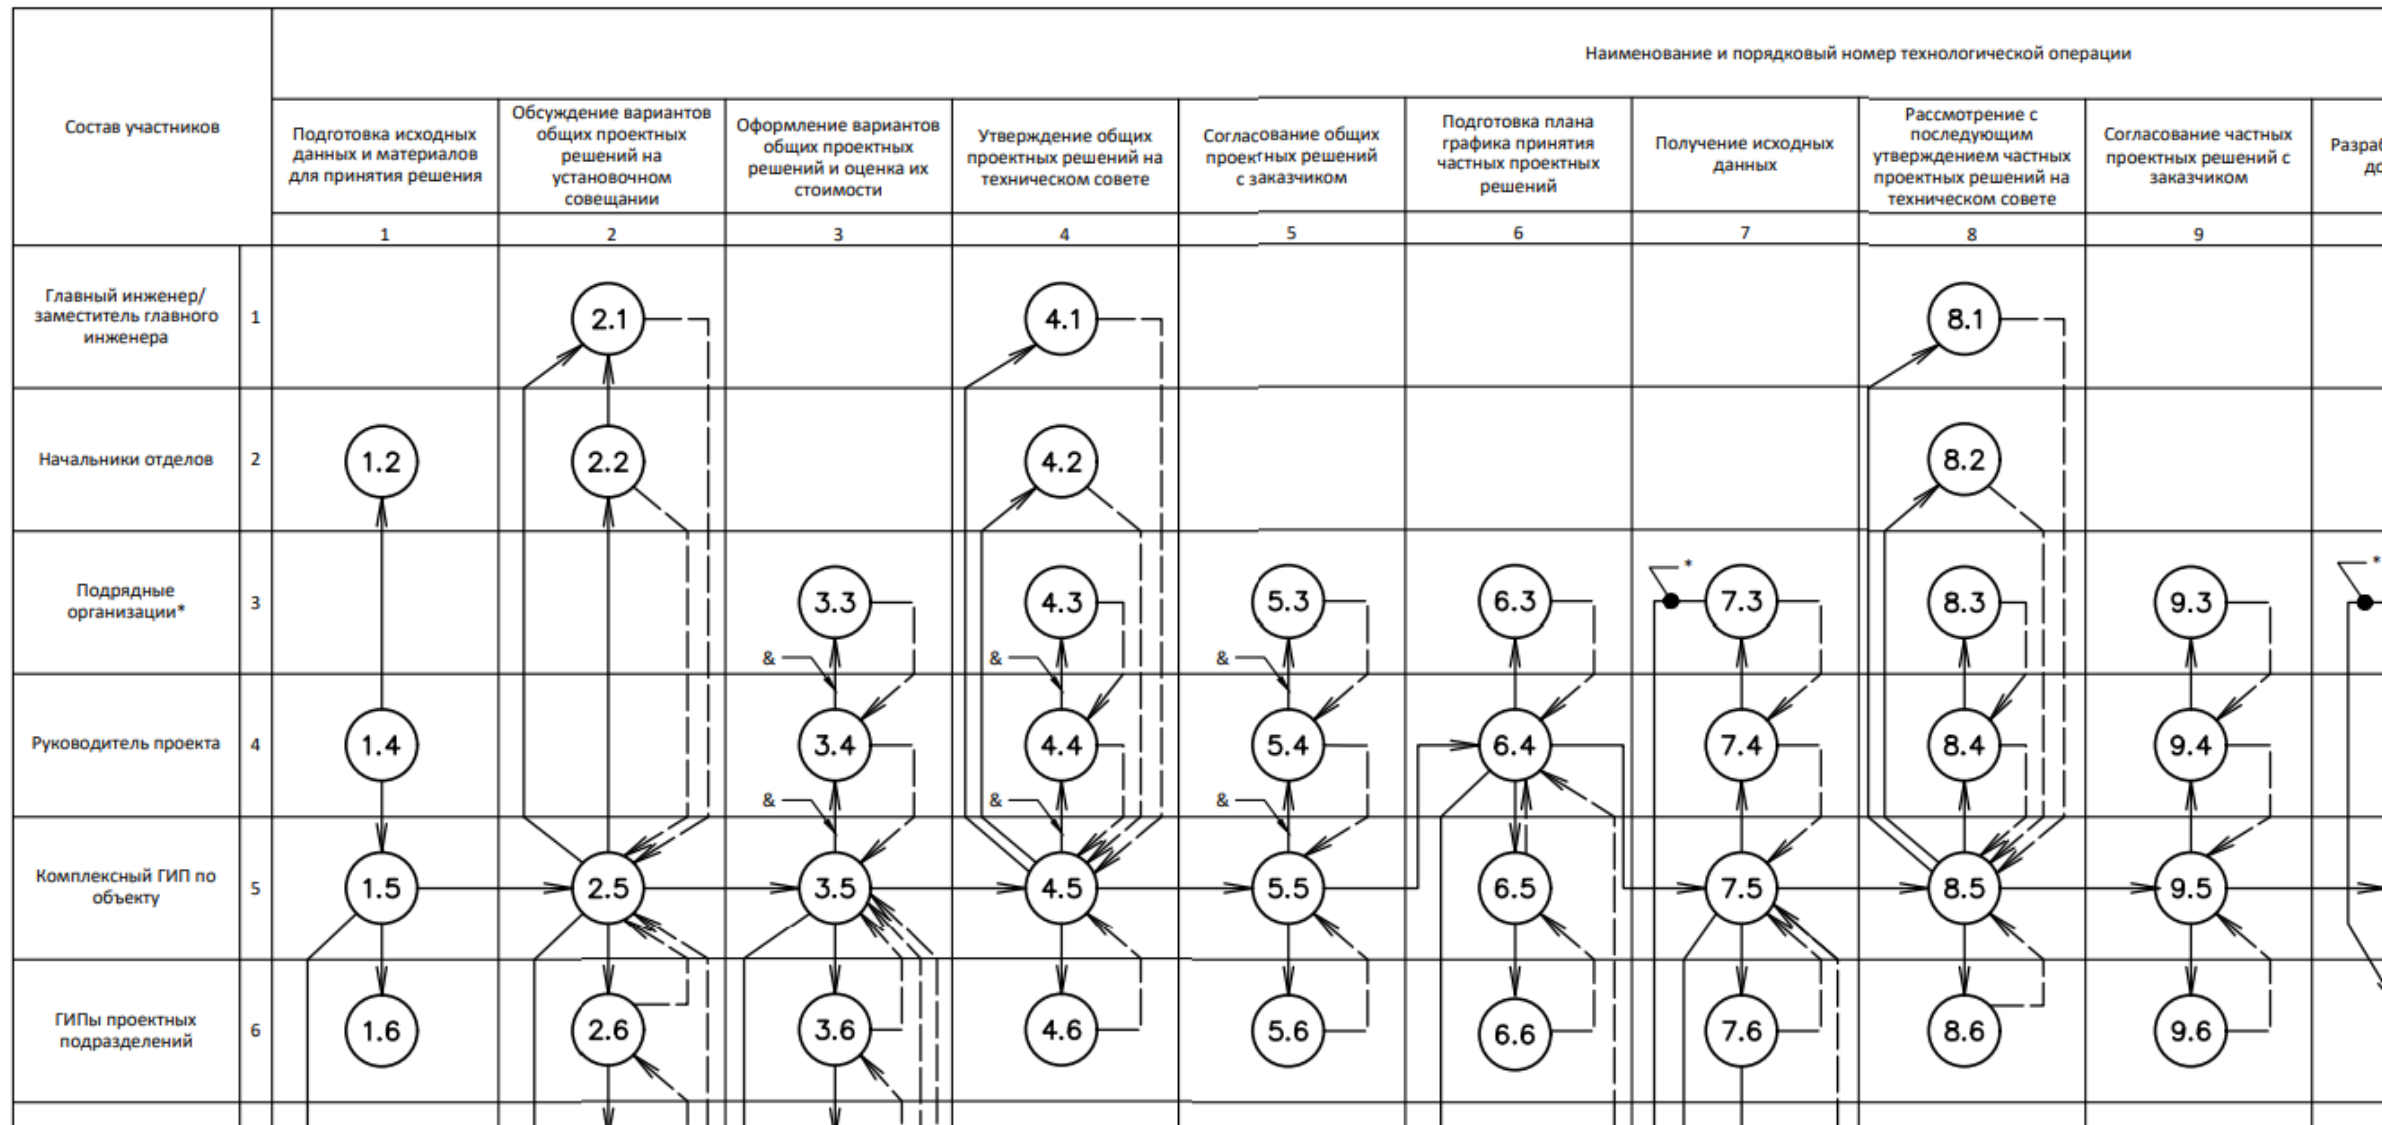

ВМ-стандарт компании и типовой план реализации проекта

Правила наименования файлов модели Блок 0	
Блок 0 Код	Расшифровка/пояснение кода
I4100	IFC4 версии 4.1.0.0 (IFC4x1)
I2300	IFC2x3 версии 2.3.0.0

Правила наименования файлов модели Блок 1	
Блок 1 Код	Версия и ПО/формат представления информации
AN21	Autodesk Navisworks 2021
AC3D	Autodesk Civil 3D
TR	Топоматик Robur
TT	Trimble Tekla

Правила наименования файлов модели Блок 2		
Блок 2 Код	Шифр раздела/ Марка (русский)	Описание содержания подмодели
3.1	ТКР	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения
3.1.1	ТКР-АД1	Автомобильная дорога. Основные проектные решения
3.1.2	ТКР-АД2	Автомобильная дорога. Конструктивные элементы
3.1.3	ТКР-АД3	Автомобильная дорога. Водопропускные трубы
3.1.4	ТКР-ОДД	Организация дорожного движения на период эксплуатации
3.1.5-3.1.20	ТКР-АСУД	Строительство светофорного объекта
3.2.1	ТКР-ШЗЭ	Шумозащитные экраны
3.2.2	ТКР-ИС1	Мост через р. Малая Язловая
3.2.3	ТКР-ИС2	Мост через р. Язловая
3.2.4	ТКР-ИС3	Путепровод через железную дорогу
3.3.2	К2	Канализация дождевая
3.3.2.1	К2-ДК	Колодцы и трубы

Наименование файлов модели этап 1							
Краткое наименование или код объекта	Шифр ИМ по разделу ПД	Номер подмодели раздела	Обозначение наименования и версии САПР	Обозначение версии IFC файла (опционально)	Полное наименование элемента сводной модели	Шифр ИМ по разделу ПД	Полное наименование раздела
Блок 4	Блок 3	Блок 2	Блок 1	Блок 0			
Сводная модель по всем разделам (Federated Model)							
117-21-ПИР-стр-1	FM	0	AN21				
Наименование общих информационных моделей для всех типов объектов							
117-21-ПИР-стр-1	PPD	0	AN21		117-21-ПИР-стр-1_PPD_0_AN21	117-21-ПИР-стр-1-СП	Состав проектной документации
117-21-ПИР-стр-1	EN	0	AN21		117-21-ПИР-стр-1_EN_0_AN21	117-21-ПИР-стр-1-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
117-21-ПИР-стр-1	EN	1	AN21		117-21-ПИР-стр-1_EN_1_AN21	117-21-ПИР-стр-1-ПЗ1	Подраздел 1. Пояснительная записка
117-21-ПИР-стр-1	EN	2	AN21		117-21-ПИР-стр-1_EN_2_AN21	117-21-ПИР-стр-1-ПЗ2	Подраздел 2. Технико-экономическая часть
117-21-ПИР-стр-1	EN	3	AN21		117-21-ПИР-стр-1_EN_3_AN21	117-21-ПИР-стр-1-ПЗ3	Подраздел 3. Копии технических условий
117-21-ПИР-стр-1	BSOS	0	AN21		117-21-ПИР-стр-1_BSOS_0_AN21	117-21-ПИР-стр-1-ПОС	Раздел 5. Проект организации строительства
117-21-ПИР-стр-1	BSOS	1	AN21		117-21-ПИР-стр-1_BSOS_1_AN21	117-21-ПИР-стр-1-ПОС1	Подраздел 1. Сводный проект организации строительства
117-21-ПИР-стр-1	BSOS	2	AN21		117-21-ПИР-стр-1_BSOS_2_AN21	117-21-ПИР-стр-1-ПОС2	Подраздел 2. Организация дорожного движения на период производства работ
117-21-ПИР-стр-1	BSOS	3	AN21		117-21-ПИР-стр-1_BSOS_3_AN21	117-21-ПИР-стр-1-ПОС3	Подраздел 3. Проект организации строительства. Мост через р. Малая Язловая
117-21-ПИР-стр-1	BSDW	0	AN21		117-21-ПИР-стр-1_BSDW_0_AN21	117-21-ПИР-стр-1-ПОД	Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта
117-21-ПИР-стр-1	BSDW	1	AN21		117-21-ПИР-стр-1_BSDW_1_AN21	117-21-ПИР-стр-1-ПОД1	Подраздел 1. Проект демонтажа зданий и сооружений

Управление проектами в сфере строительства



VTM project

автоматизированная система управления организацией



УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКУПКАМИ



УПРАВЛЕНИЕ
СТОИМОСТЬЮ
ПРОЕКТА



УПРАВЛЕНИЕ
СРОКАМИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ



УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНИКАЦИЯМИ



ОТЧЕТЫ О ХОДЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ ПО ПРОЕКТУ



УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ





УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВОМ



УПРАВЛЕНИЕ
ДОГОВОРАМИ

Управление проектами в сфере строительства

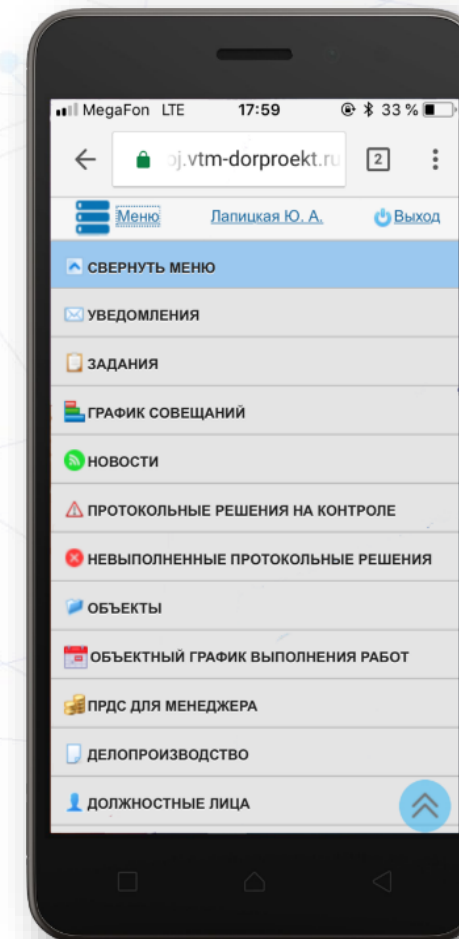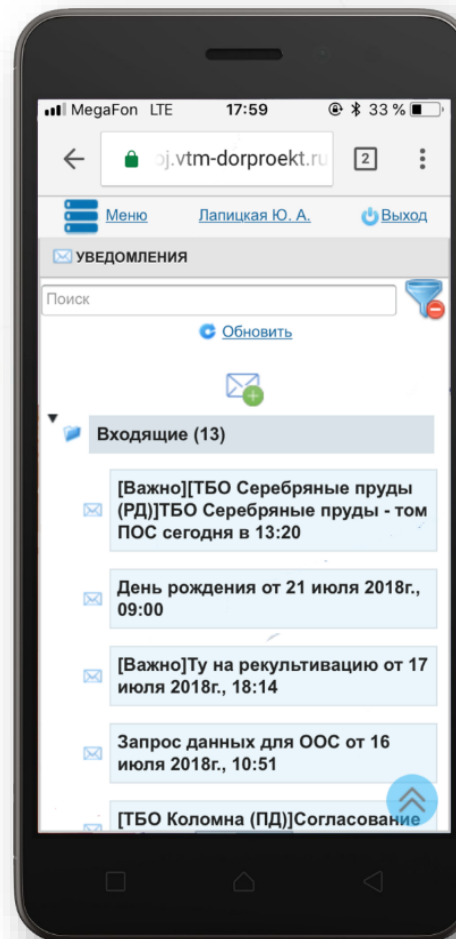

Управление предметной областью

Свернуть меню

- Уведомления
- Новости
- Невыполненные протокольные решения
- Невыполненные работы объектного графика
- Объекты
 - Предварительные
 - В работе
 - Отложен
 - Не принят в работу
 - Условно закрыт (ПД + экспертиза)
 - Закрыт
 - Удален
 - Доработка после выпуска
 - Я - менеджер
 - Я - ГИП
 - Я - куратор
 - Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход (#5850)
 - Старосимферопольское шоссе, ПП (РД) (#6583)
- Задачи
 - Свидетельства и сертификаты
 - Делопроизводство
 - Должностные лица
 - Мои контакты
 - Субподрядные организации
 - Согласующие организации
 - Заказчики
 - Договоры
 - Справочные файлы
 - Архив

ВТМ | Сообщения | Рабочая зона | Закупки | Предварительная работа с Заказчиком | Объект | Информация | Субподрядные работы | Передков А. В. | Выход

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

Приостановлен | Завершен | Чек-лист | Обсуждение | Информация по Объекту | Файлы ТЭП | Редактировать параметры | Редактировать

стоимости проектных работ по объекту | государственной экспертизы

Добавить

В работе | Выполненные | Риски | Важные | Просроченные задания

	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАДАЧИ	№	ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАДАЧЕ	АВТОР ЗАДАЧИ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ОТДЕ
Задачи	Универсальное задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий	5850.3	Необходимо выполнить отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям	Баскаков Антон Юрьевич	Козлов Дмитрий Викторович	
	ЗАДАНИЕ на разработку тома АД (автобусные остановки, подходы (тротуары) к проектируемому НПП).	5850.3	Необходимо предусмотреть устройство автобусных остановок в месте размещения наземного пешеходного	Баскаков Антон Юрьевич	Молоков Александр Владимирович	
	Универсальное задание на выпуск проектной документации в 1 (одном) экземпляре	5850.4		Камышников Павел Сергеевич	Михайлова Галина Евгеньевна	
	Универсальное задание на выпуск проектной документации в 1 (одном) экземпляре. Инженерно-экологические изыскания	5850.5		Камышников Павел Сергеевич	Михайлова Галина Евгеньевна	
	Прошу распечатать чертежи к совещанию	5850.6	Прошу распечатать и сложить чертежи сегодня (до 11:55)	Сафонов Юрий Алексеевич	Михайлова Галина Евгеньевна	
	ЗАДАНИЕ на проектирование	5850.4	Людмила Анатольевна!	Сафонов Юрий	Ромашова	



Задания в адрес смежных структурных подразделений

Управление предметной областью

BTM | Сообщения | Рабочая зона | Закупки | Предварительная работа с Заказчиком | Объект | Информация | Субподрядные работы | Задачи | Задания на выполнение работ | [Передков А. В.](#) | [Выход](#)

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

[Статус проверки состава проекта:](#) **Версия проекта**
Новая версия проекта от 11-07-2017 00:00 [Создать шаблон](#) [Просмотр шаблонов](#) [Удаленные/неактивные позиции](#)

Состав проекта | Нормоконтроль от BTM | Техконтроль - Солдатов М.Ю. | Техконтроль - Кузема Е.В. | Контроль от Заказчика | Контроль от Экспертизы

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

[Печатать](#) [Фильтр](#) [Создать новую версию состава проекта из текущей](#) [Информация о версии состава проекта](#) [Удалить версию](#) [Обсуждение](#) [Помощь](#)

Том разработан субподрядной организацией Том не привязан к разделу

Состав проекта по объекту Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход Версия : Новая версия проекта от 11-07-2017 00:00 (версия для учета рабочего времени)

НОМЕР ТОМА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ПЕРЕДАЧИ ТОМА ЗАКАЗЧИКУ	ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ПЕРЕДАЧИ ТОМА ЗАКАЗЧИКУ	СУБПОДРЯДН
▼ Сбор исходных данных					
▼ Отчет по сбору исходных данных	1/2017-07-СИД	Отчет по сбору исходных данных			
▼ Археологическое обследование	1/2017-07-АО	Отчет об археологическом обследовании			
▼ Материалы инженерных изысканий					
▼ Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям	1/2017-07-ИИ	Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям			
▼ Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям	1/2017-07-ИГ	Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям			
▼ Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям	1/2017-07-ИЭ	Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям			
▼ Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям	1/2017-07-ИПМ	Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям			
▼ Раздел 1 'Пояснительная записка'					
▼ 1.1	1/2017-07-ПЗ1	Часть 1 "Пояснительная записка"			
▼ 1.2	1/2017-07-ПЗ2	Часть 2 "Копии документов согласований"			
▼ Раздел 2 'Проект полосы отвода'					
▼ 2.1	1/2017-07-ППО	Часть 1 "Проект полосы отвода"			



Состав проекта

Управление проектом по временным параметрам

VTM Сообщения Рабочая зона Закупки Предварительная работа с Заказчиком Объект Информация Субподрядные работы Задачи Задания на выполнение работ Передков А. В. Выход

Объектный график Объектный график (для редактирования) Объектный график по договору

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

Объектный график выполнения работ по объекту Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход версия Новая версия проекта от 11-07-2017 00:00 [Утвержден]

НОМЕР ТОМА				ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА НАЧАЛА	ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ	ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО	СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Сформирован и согласован протокол распределе	✓			10.07.2017	21.07.2017	Передков Антон Владимирович	Центр управления проектам
Сформирован состав проекта в VTM project	✓			17.07.2017	21.07.2017	Баскаков Антон Юрьевич	Отдел проектирования искус
Сформирован и согласован объектный график с	✓			14.07.2017	19.07.2017	Передков Антон Владимирович	Центр управления проектам
Проведено установочное совещание по объекту с	✓			14.07.2017	17.07.2017	Передков Антон Владимирович	Центр управления проектам
Проведено установочное совещание с главными и	✓			24.07.2017	21.07.2017	Баскаков Антон Юрьевич	Отдел проектирования искус
Осуществлен выезд на объект комплексного ГИП:	✓			17.07.2017	21.07.2017	Баскаков Антон Юрьевич	Отдел проектирования искус
► Сбор исходных данных						Акимулла Рафикович	Отдел подготовки исходно - р
► Материалы инженерных изысканий						Сергей Юрьевич	Администрация(Москва
► Раздел 1 'Пояснительная записка'	✓			01.11.2017	30.11.2017	Баскаков Антон Юрьевич	Отдел проектирования искус
► Раздел 2 'Проект полосы отвода'	✓			01.11.2017	30.11.2017	Баскаков Антон Юрьевич	Отдел проектирования искус
▼ Раздел 3 'Технологические и конструктивные решения'	✓			21.08.2017	30.09.2017	Баскаков Антон Юрьевич	Отдел проектирования искус
► Подраздел 1 Искусственные сооружения	✓			21.08.2017	30.09.2017	Баскаков Антон Юрьевич	Отдел проектирования искус
► Подраздел 3 Инженерные коммуникации	✓			21.08.2017	30.09.2017	Горлов Андрей Викторович	Отдел проектирования инже
► Раздел 5 'Проект организации строительства'	✓			30.10.2017	30.11.2017	Баскаков Антон Юрьевич	Отдел проектирования искус
► Раздел 7 'Мероприятия по охране окружающей среды'	✓			09.10.2017	10.11.2017	Кислинская Мария Владимировна	Отдел подготовки исходно - р

ИТОГО: 294

Переписка должностных лиц

Текст сообщения

Отправить

Справка

Редактирование

Редактирование вида работ

Раздел

Если требуется

Номер тома*

Сбор исходных данных

Обозначение

Наименование раздела / тома / вид

Процент выполнения

0

Планируемая дата начала

10.07.2017

Осуществлен выезд на объект комплексного ГИП с представителями соответствующих структурных подразделений с целью оценки транспортной доступности прилегающих территорий, границ сьемки, наличия зданий (строений), зеленых насаждений

Управление стоимостью проекта

ВТМ
Сообщения
Рабочая зона
Закупки
Предварительная работа с Заказчиком
Объект
Информация
Субподрядные работы
Лалицкая Ю. А.
Выход

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

Печатать
Фильтр
Наименование организации
Статус
 Договора с актами
 Раскрыть все пункты

Условные обозначения:
 📄 Договор (Г - гражд. прав-ой, Т - трудовой)
📄 Договор (файл договора отсутствует)
🟢 Договор заключен
🔴 Договор не заключен
🔵 Договор отменен

Информации о договорах Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА/ДОГОВОРА	МЕНЕДЖЕР	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ(ВТМ)	ЗАКАЗЧИК	СТОИМОСТЬ РАБОТ, УКАЗАННАЯ В ДОГОВОРЕ(КОНТРАКТ) РУБ
▼ Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	Передков Антон Владимирович			
▼ Договор 1/2017-07 от 14.06.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ГКУ МО "ДДС"	7 920 431.0
📄 Акт 1 от 20.09.2017г. (подписан)				
📄 Акт 2 от 16.11.2017г. (подписан)				
📄 Акт 3 от 26.12.2017г. (подписан)				
▼ Договора субподряда				
📄 Договор субподряда ИИ-11/06-М от 15.06.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ООО "Мериди"	2 366 069.5
📄 Договор субподряда 1ВТМ/1/2017-07 от 02.10.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ИЦ Безопасно	70 000.00
📄 Доп. соглашение ДС №1 к Договору 1/2017-07 от 14.06.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ГКУ МО "ДДС"	0.00
📄 Договор субподряда 02-2017-065 от 28.09.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ООО "Совтлай"	30 000.00
📄 Договор субподряда 02-2017-064 от 28.09.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ООО "Совтлай"	18 000.00
📄 Договор субподряда 173-17 от 26.10.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	Институт архек	84 066.36
🔴 Договор субподряда 1ВТМ/1/2017-07 от 21.11.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ГКУ МО "ДДС"	150 000.00
📄 Договор субподряда 2ВТМ/1/2017-07 от 21.11.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ООО "Винал"	150 000.00
📄 Договор субподряда 3ВТМ/1/2017-07 от 20.02.2019		ООО "ВТМ довлпроект СТОЛИЦА"	ООО "Технопп"	146 675.47
ИТОГО:1				10 935 242.35

Свернуть меню

- Уведомления
- Новости
- ⚠️ Протокольные решения на контроле
- ⛔ Невыполненные протокольные решения
- 📄 Невыполненные работы объектного графика
- 📍 Объекты
- 📋 Задачи
- 📄 Свидетельства и сертификаты
- 📄 Делопроизводство
- 👤 Должностные лица
- 👤 Мои контакты
- 👤 Субподрядные организации
- 👤 Согласующие организации
- 👤 Заказчики
- 📄 Договоры
- 📄 АКТ
- 🚩 Акт не подписан
- 📄 Акт подписан
- 📄 Прикреплены файлы
- ООО "ВТМ дорпроект" СТОЛИЦА
- ▼ Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход
 - 📄 Договор 1/2017-07 от 14.06.2017
 - 📄 Договор субподряда ИИ-11/06-М от 15.06.2017
 - 📄 Договор субподряда 1ВТМ/1/2017-07 от 02.10.2017
- 📄 Справочные файлы
- 📄 Архив

Управление коммуникациями

Входящие с «30» мая 2016г. по «02» июля 2018г.

			ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ СООБЩЕНИЯ	ОТПРАВИТЕЛЬ	ЗАГОЛОВОК СООБЩЕНИЯ	СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
!		★	09 августа 2017г., 16:14	Теодоронская Маргарита Владимировна	задания нет	задания нет
		★	09 августа 2017г., 15:13	Михайлов Василий Михайлович	Ответ ГУ культурного наследия МО	Ответ ГУ культурного наслед
		★	07 августа 2017г., 08:57	Кислинская Мария Владимировна	Расчет объемов и стоимости ИЗИ	Добрый день! Прошу согласовать с Ткаченко М.В. объемы инжк
		★	04 августа 2017г., 15:30	Гармашов Роман Анатольевич	Согласование	Согласование: Прошу Вас рассмотреть и согласовать задание :
		★	31 июля 2017г., 16:56	Елистратов Дмитрий Анатольевич	Исходные данные от Подольска	Добрый день, коллеги. Получены исх. данные от комитета по ст
		★	29 июня 2017г., 13:00	Гармашов Роман Анатольевич	Согласование	Согласование: Прошу Вас рассмотреть и согласовать задание
		★	27 июня 2017г., 10:15	Шашина Елена Александровна	Исполнитель не ознакомился с заданием 'Заявка на оформление	Информируем Вас о том, что за последние 1 сутки(ок) Соснов
		★	16 июня 2017г., 18:30	Гармашов Роман Анатольевич	Согласование	Согласование: Прошу Вас рассмотреть и согласовать задание :
		★	16 июня 2017г., 10:15	Шашина Елена Александровна	Исполнитель не ознакомился с заданием 'ЗАДАНИЕ на проектиро	Информируем Вас о том, что за последние 10 сутки(ок) Баскак
		★	15 июня 2017г., 10:15	Шашина Елена Александровна	Исполнитель не ознакомился с заданием 'ЗАДАНИЕ на проектиро	Информируем Вас о том, что за последние 9 сутки(ок) Баскако
		★	14 июня 2017г., 10:15	Шашина Елена Александровна	Исполнитель не ознакомился с заданием 'ЗАДАНИЕ на проектиро	Информируем Вас о том, что за последние 8 сутки(ок) Баскако
		★	13 июня 2017г., 10:15	Шашина Елена Александровна	Исполнитель не ознакомился с заданием 'ЗАДАНИЕ на проектиро	Информируем Вас о том, что за последние 7 сутки(ок) Баскако
		★	12 июня 2017г., 10:15	Шашина Елена Александровна	Исполнитель не ознакомился с заданием 'ЗАДАНИЕ на проектиро	Информируем Вас о том, что за последние 6 сутки(ок) Баскако
		★	09 июня 2017г., 10:15	Шашина Елена Александровна	Исполнитель не ознакомился с заданием 'ЗАД	Стартовал объект Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход. Прошу оформить состав проекта, объектный график, протокол распределения денежных средств, график внутренних совещаний в обязательном порядке. Все технические советы, совещания по объекту необходимо назначить с использованием формы график совещаний с обязательным размещением протоколов всех совещаний (внешних и внутренних) в программе.
		★	08 июня 2017г., 10:15	Шашина Елена Александровна	Исполнитель не ознакомился с заданием 'ЗАД	
		★	07 июня 2017г., 10:15	Шашина Елена Александровна	Исполнитель не ознакомился с заданием 'ЗАД	
		★	07 июня 2017г., 09:20	Шашина Елена Александровна	Стартовал новый объект	

Быстрый обмен сообщениями и прямая отправка писем на адрес электронной почты получателя

Делопроизводство

ВТМ | Сообщения | Рабочая зона | Закупки | Предварительная работа с Заказчиком | Объект | Информация | Субподрядные работы | Задачи | Задания на выполнение работ | Лалицкая Ю.А. | Выход

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

Печатать | Фильтр | Наименование организации | Статус документа | Статус контроля | Регистрационный номер | Аналитика писем ?

ЖУРНАЛ учета входящих/исходящих документов с «01» июля 2017г по «31» июля 2018г.

ОБЪЕКТ	Иконки	НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩЕГО / ВХОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА В СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩЕГО / ВХОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА В СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	РЕГ. НОМЕР	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄✅☆	ООО "Технопроект"	о направлении документов	144-2018/ТП	17.05.2018	85-05	21.05.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄☆	Министерство государственного упр:	Сопасование ПД			171-03	27.03.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄☆	администрация г.Подольск	о предоставлении ген плана			84-03	14.03.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄✅☆	Центральный архив Министерства	ответ на обращение	1/81950	28.08.2017	12-03	01.03.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄☆	ГКУ МО "ДДС"	Об отсутствии претензий по оплате			104-02	12.02.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄✅☆	Администрация Подольского муницип	Запрос на предоставление копий с	С-27/6/41	30.01.2018	13-02	05.02.20
▶ Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄☆	Администрация го. Домоделов	Запрос информации о полинках			252-01	29.01.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄☆	Администрация Наро-Фоминского	Просмотр карточки документа			251-01	29.01.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄☆	администрация Одинцовского	Просмотр прикрепленных документов			250-01	29.01.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄☆		Прикрепить файл			249-01	29.01.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄☆		Оповещение			249-01	29.01.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄✅☆	ГБУ МО "Мосавтодор"	Сохранить настройки таблицы	исх-3811/2018	24.01.2018	64-01	26.01.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄✅☆	ИЦ Безопасность	Восстановить начальные настройки таблицы	исх-19	19.01.2018	36-08	22.01.20
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	🏠👤📄☆	ГБУ МО "Мосавтодор"	о направлении документации			110-01	18.01.20

Всего: 74; С нарушением срока ответа: 1; Прикреплена копия письма в карточке редактирования: 73; Указан входящий номер письма при регистрации в сторонней организации: 21;

[Загрузить выбранное письмо из таблицы](#)

☑ Регистрация всей корреспонденции с привязкой к конкретному проекту

Управление рисками

■ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



Управление проектными рисками – анализ, оценка и реализация мер снижения рисков в процессе выполнения работ.

ТИПЫ РИСКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

- необоснованные технические решения;
- несогласованная работа специалистов;
- отсутствие исходных данных, увязки проектных решений, технических условий, согласований;
- отказы работы оргтехники.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

- ошибочные управленческие решения;
- низкий уровень квалификация отдельных сотрудников;
- несогласованность действий, отсутствие контроля соблюдения установленных в организации регламентов;
- несвоевременное заключение договоров со сторонними организациями.

ПРАВОВЫЕ

- изменения в действующем законодательстве;
- несоблюдение контрагентами договорных обязательств.

Управление качеством



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

выпускаемой
проектной
продукции

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ

- Менеджер объекта
- Комплексный главный инженер проекта

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ

- Комплексный главный инженер проекта
- Главные инженеры проектов по отдельным направлениям
- Ответственные исполнители работ
- Должностные лица, осуществляющие нормоконтроль отдельных томов


КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

- Специалисты, осуществляющие технический контроль по отдельным разделам и объекту в целом
- Специалисты отдела выпуска проектной продукции, осуществляющие контроль выполнения требований по оформлению проектной продукции
- Менеджер объекта проверяет соблюдение установленных в организации процедур по проверке проектной продукции до момента сдачи заказчику



ПРОЕКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ,

соответствующая
ожиданиям
Заказчика

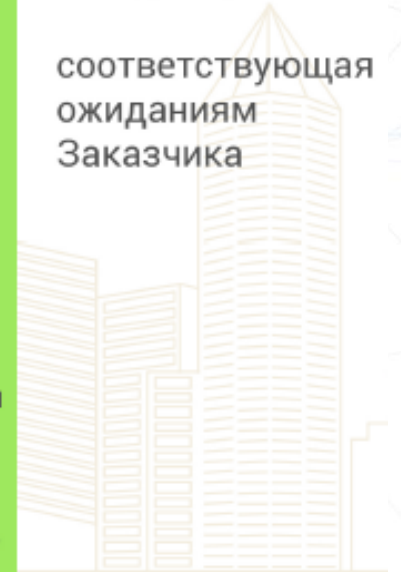

Управление качеством

ВТМ [Сообщения](#) [Рабочая зона](#) [Закупки](#) [Предварительная работа с Заказчиком](#) [Объект](#) [Информация](#) [Субподрядные работы](#) [Задачи](#) [Задания на выполнение работ](#) [Лалицкая Ю. А.](#) [Выход](#)

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

Версия проекта
 Новая версия проекта от 11-07-2017 00:00 [Создать шаблон](#) [Просмотр шаблонов](#) [←](#) [→](#) [Удаленные/неактивные позиции](#)

Состав проекта [Нормоконтроль от ВТМ](#) [Техконтроль - Солдатов М.Ю.](#) [Техконтроль - Кузема Е.В.](#) [Контроль от Заказчика](#) [Контроль от Экспертизы](#)

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

[Печать](#) [Фильтр](#) [Информация по субподрядам](#) [Сравнить версии состава проекта](#) [Обсуждение](#)

● Отправлен на проверку
● Проверен, требует внимания
● Проверен, замечания устранены
● Проверка не требуется
● Проверен, замечания не устранены
● Разработан субподрядной организацией

Состав проекта по объекту Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход

НОМЕР ТОМА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ	АВТОР ЗАПРОСА	ДАТА ЗАПРОСА	ПЛА
▼ 3.2.2	1/2017-07-ТКР2.:	Часть 2 "Организация движения на период эксплуатации "	✓	Гусев Александр Владимирович	13.12.2017	▲
▼ 3.2.3	1/2017-07-ТКР2.:	Часть 3 "Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населен-				
▼ Подраздел 1 Искусственные сооружения						
▼ 3.1.1.1	1/2017-07-ТКР1.:	Часть 1 "Надземный пешеходный переход" Книга 1 "Строительные решения"				
▼ 3.1.1.2	1.2017-07-ТКР1.:	Часть 1 "Надземный пешеходный переход" Книга 2 "Вертикальный транспорт"				
▼ 3.1.2	1/2017-07-ТКР1.:	Часть 2 "Шумозащитный экран"				
▼ 3.1.3	1/2017-07-ТКР1.:	Часть 3 "Г-опора под ЗИП"				
▼ Подраздел 3 Инженерные коммуникации						
▼ 3.3.1	1/2017-07-ТКР3.:	Часть 1 "Наружное электроосвещение. Освещение и электрооборудование над	✓	Балькина Светлана Владимировн:	13.10.2017	
▼ 3.3.2	1/2017-07-ТКР3.:	Часть 2 "Электроснабжение 0,4 кВ"	✓	Балькина Светлана Владимировн:	13.10.2017	
▼ 3.3.3	1/2017-07-ТКР3.:	Часть 3 "Защита водопровода"				

 Мониторинг хода проверки результатов работ

Управление качеством

ВТМ | Сообщения | Рабочая зона | Закупки | Предварительная работа с Заказчиком | Объект | Информация | Субподрядные работы | Задачи | Задания на выполнение работ | Лалицкая Ю.А. | Выход

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

Печатать все | Печатать только требующие детальной проработки | Фильтр

Создано обсуждение в корпоративном чате

Журнал фиксации типовых ошибок

АВТОР	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ДАТА СОЗДАНИЯ	ОПИСАНИЕ ВЫЯВЛЕННОЙ ОШИБКИ
Грушихина Жанна Сергеевна	Внуково	13.10.2016	Не соответствие штампов
Грушихина Жанна Сергеевна	Внуково	02.11.2016	Не корректные условные обозначения
Грушихина Жанна Сергеевна	Внуково	01.12.2016	Применение различных типов шрифтов
Шашина Елена Александровна	СИД (1 этап)	08.12.2016	Технические условия и согласования, выданные не на ту организац
Лазебный Виталий Вячеславович	Домодедово, АН путепровод ул. Гагарина	18.07.2017	Опора №1 ВЛ10 запроектирована вне отвода земли.
Гуляев Никита Дмитриевич	Грайвороновский пр-д (ПД, РД)	01.08.2017	Проектируемые внутриквартальные проезды расположены вне границ красных линий и границ межеван
Грушихина Жанна Сергеевна	А-107 капремонт	24.10.2017	Не своевременно выдано з Проектируемые внутриквартальные проезды расположены вне границ красных линий и границ межевания утвержденноу проекта планировки.
Грушихина Жанна Сергеевна	Скопково 52 км (ПД_ГГЭ)	24.10.2017	Получено заключение МОК1У не учитывающие все водные объекты
Грушихина Жанна Сергеевна	Туполева, капитальный ремонт км 0-км 1,5 (АН)	10.11.2017	Фактическое размещение теплосети не соответствовало проектном
Горлов Андрей Викторович	Туполева, капитальный ремонт км 0-км 1,5 (АН)	18.11.2017	В ходе проведения авторского надзора за выполнением работ по перекладке тепловой сети выявлено, что фактическое п
Гуляев Никита Дмитриевич		23.01.2018	Разночтения между отчетом по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям и отчетом Мосobl
Гуляев Никита Дмитриевич		23.01.2018	Разночтения между отчетом по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям и проектными решениями (в части
Грушихина Жанна Сергеевна	Остафьевское шоссе (АН)	05.02.2018	В сводном ПОС граница рубки указана без учета охранных зон инженерных кс
Грушихина Жанна Сергеевна		05.02.2018	Не соответствие актуализированного КПП схеме размещения объектов капитального строительства утвержден
Лалицкая Юлия Александровна	ТБО Коломна (ПД)	22.02.2018	Получено согласование съемки эксплуатирующей организации без указания действующий магистральный газопровод или

Переписка должностных лиц

Текст сообщения

Отправить

Справка

Журнал фиксации типовых ошибок

Управление закупками и договорами

Свернуть меню

- Уведомления
- Новости
- Невыполненные протокольные решения
- Невыполненные работы объектного графика
- Объекты
- Задачи
- Свидетельства и сертификаты
- Делопроизводство
- Должностные лица
- Мои контакты
- Субподрядные организации
- Согласующие организации
- Заказчики
- Договоры

Прикреплены файлы

- ООО "ВТМ дорпроект" СТОЛИЦА
- Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход
 - Договор 1/2017-07 от 14.06.2017
 - Договор субподряда ИИ-11/06-М от 15.06.2017
 - Договор субподряда 1ВТМ/1/2017-07 от 02.10.2017
 - Договор субподряда 02-2017-065 от 28.09.2017
 - Договор субподряда 02-2017-064 от 28.09.2017
 - Договор субподряда 173-17 от 28.09.2017

Справочные файлы

Архив

ВТМ | Сообщения | Рабочая зона | Закупки | Предварительная работа с Заказчиком | Объект | Информация | Субподрядные работы | Передков А. В. | Выход

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

Наименование организации: Статус: Договора с актами [Раскрыть все пункты](#) [Свернуть](#)

Условные обозначения: Договор (Г - гражд. прав-ой, Т - трудовой) Договор (файл договора отсутствует) Договор заключен Договор не заключен Договор отменен

Информации о договорах Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА/ДОГОВОРА	МЕНЕДЖЕР	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ(ВТМ)	ЗАКАЗЧИК	СТОИМ УКА: ДОГОВОРА
Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход	Передков Антон Владимирович			
Договор 1/2017-07 от 14.06.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ГКУ МО "ДДС"	
Акт 1 от 20.09.2017г. (подписан)				
Акт 2 от 16.11.2017г. (подписан)				
Акт 3 от 26.12.2017г. (подписан)				
Договора субподряда				
Договор субподряда ИИ-11/06-М от 15.06.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ООО "Меридиан"	
Договор субподряда 1ВТМ/1/2017-07 от 02.10.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ИЦ Безопасность	
Доп. соглашение ДС №1 к Договору 1/2017-07 от 14.06.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ГКУ МО "ДДС"	
Договор субподряда 02-2017-065 от 28.09.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ООО "Совтлайн"	
Договор субподряда 02-2017-064 от 28.09.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ООО "Совтлайн"	
Договор субподряда 173-17 от 26.10.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	Институт археологии РАН	
Договор субподряда 1ВТМ/1/2017-07 от 21.11.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ГКУ МО "ДДС"	
Договор субподряда 2ВТМ/1/2017-07 от 21.11.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ООО "Винал"	
Договор субподряда 3ВТМ/1/2017-07 от 28.09.2017		ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	ООО "Технопроект"	
ИТОГО:1				10 9

Организация-контрагент: ИЦ Безопасность

Договора с субподрядными организациями

Управление выполнением установленных требований


ВТМ | Сообщения | Рабочая зона | Закупки | Предварительная работа с Заказчиком | Объект | Информация | Субподрядные работы | Задачи | Задания на выполнение работ | [Передков А. В.](#) | [Выход](#)

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

[Печатать](#) | [Печатать с разделами](#) | [Фильтр](#) | Менеджер объекта | Статус объекта | [Отдел - Объект](#) | [Раскрыть все пункты](#) | [Свернуть все пункты](#)

Отчет о соблюдении корпоративных требований

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	НАЛИЧИЕ ОТСКАНИРОВАННОГО ДОГОВОРА	СТОИМОСТИ ПО ЭТАПАМ	ПРОТОКОЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕН. СР-В	НАЛИЧИЕ СОСТАВА ПРОЕКТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ	НАЛИЧИЕ ПРИКАЗА О НАЗНАЧЕНИИ МЕНЕДЖЕРА И ГИПА
<ul style="list-style-type: none"> ▼ Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход ✓ СИД ✓ Инженерно-геодезические изыскания ✓ Инженерно-геологические и гидрометеорологические изыскания ✓ Инженерно-экологические изыскания ✓ Дендроплан и перечетная ведомость ✓ АД (тротуар, водоотвод, автобусные остановки) ✓ Надземный пешеходный переход ✓ Опоры под информ щиты и ЗИП ✓ Озеленение территории ✓ Пожарная безопасность ✓ ММГН ✓ НО и освещение пешеходного перехода 	✓	✓	Утвержден	✓	Отдел проектирования искусственных сооружений(г.Москва)	✓
					Отдел проектирования искусственных сооружений(г.Москва)	
					Отдел проектирования искусственных сооружений(г.Москва)	
					Отдел проектирования искусственных сооружений(г.Москва)	
					Отдел проектирования искусственных сооружений(г.Москва)	
					Отдел проектирования благоустройства и озеленения(г.Москв	
					Отдел проектирования дорог(г.Москва)	
					Отдел проектирования искусственных сооружений(г.Москва)	
					Отдел проектирования искусственных сооружений(г.Москва)	
					Отдел проектирования благоустройства и озеленения(г.Москв	
					Отдел проектирования искусственных сооружений(г.Москва)	
					Отдел проектирования искусственных сооружений(г.Москва)	
					Отдел проектирования инженерных коммуникаций(г.Москва)	


Контроль соблюдения корпоративных стандартов, регламентирующих порядок выполнения работ

Управление выполнением установленных требований

ЖУРНАЛ учета протоколов совещаний

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

Печатать
 Фильтры
 Поиск
 Объект
 Статус контроля
 Раскрыть все пункты
 Свернуть все пункты

14
 Внутреннее совещание
 Внешнее совещание
 Тех. совет
 Мои решения
 невыполненные решения

✔ Совещание проведено
🕒 Совещание перенесено
✖ Совещание отменено
! Поставлен на контроль
✓ Снят с контроля
✔ Выполнено
✖ Не выполнено

ЖУРНАЛ учета протоколов совещаний, График совещания Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход от 14.09.2017г!

СОВЕЩАНИЕ О / РЕШЕНИЕ	ВЫПОЛНЕНО	СТАТУС	ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО	СООБЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ	ДАТА СОЗДАНИЯ СООБЩЕНИЯ	
▶ Выдать Ромашовой Л.А. задание на ОДД и расстановку опор ЗИ	✔		Сафонов Юрий Алексеевич			Старосимферополь
▶ Запросить ТУ на переустройство по сетям, которые подтвержде	✔		Зотов Сергей Олегович			Старосимферополь
▼ Рассмотреть водоотведение на объекте	✔		Савченко Юрий Васильевич			Старосимферополь
				Рассмотрено, водоотвод в сущ. систему Л	25.09.2017	Старосимферополь
Уточнить назначения насосов в камере	✔		Астапович Александр Анатольевич	Рассмотрено, водоотвод в сущ. систему ЛК		Старосимферополь
▶ Добавить в пешеходный переход внутренние сети - видеонаблю,	✔		Сафонов Юрий Алексеевич			Старосимферополь
ПОС оформить одним томом	✔					Старосимферополь
Подтвердить срок готовности ООС 12.10.17	✔		Кислинская Мария Владимировна			Старосимферополь
▶ Запросить исходные данные в МЧС на ГОиЧС и пож безопаснос	✔		Сафонов Юрий Алексеевич			Старосимферополь
▶ Включить ГОиЧС в состав преекта	✔		Сафонов Юрий Алексеевич			Старосимферополь
▶ Подготовить обращение в администрацию для согласования пл	✔		Сафонов Юрий Алексеевич			Старосимферополь
Завершить согласование съемки	✔		Овсянников Валерий Константинович			Старосимферополь
▶ Выдать задание на уточнение на съемке местоположения стое	✔		Сафонов Юрий Алексеевич			Старосимферополь
▶ Выдать задание на озеленение после уточнения переустройств	✔		Сафонов Юрий Алексеевич			Старосимферополь

Всего совещаний: 1 Выполнено решений: 25, не выполнено: 0 Решений на контроле: 0 Всего решен

Контроль исполнения протокольных решений

Управление выполнением установленных требований

ВТМ Сообщения Рабочая зона Закупки Предварительная работа с Заказчиком Объект Информация Субподрядные работы Лапицкая Ю. А. Выход

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

Печатать Отдел - Объект Отчет за неделю для ГИПа Раскрыть все пункты Свернуть все пункты

Отчет за неделю для менеджера за все периоды

НАИМЕНОВАНИЕ	НЕДЕЛЯ	% ВЫПОЛНЕ
Получение подписанного договора.	с «12» июня 2017г. по «18» июня 2017г.	
Подготовка материалов для техсовета у заказчика, выдача заданий на все виды изысканий	с «26» июня 2017г. по «02» июля 2017г.	
Проведение внутреннего техсовета и техсовета в ДДС по определению местоположения ИС.	с «03» июля 2017г. по «09» июля 2017г.	
Определение перспективной интенсивности пешеходного движения, оформление карт схем с указанием ареалов пешеходной доступности и указанием интенсивности пешеходного движения. (Ильченко Александр Алек сандрович)	с «10» июля 2017г. по «16» июля 2017г.	
Подготовка материалов к выездному совещанию по объекту.		
Проведение совещания в администрации го. Подольск, выдача заданий на ИИ.	с «17» июля 2017г. по «23» июля 2017г.	
Выезд ГИПа и изыск ателей на место для выдачи окончательных заданий на изыскания.	с «24» июля 2017г. по «30» июля 2017г.	
Подготовка материалов на сдачу 1 этапа согласно к алендарного плана - СИД, инженерные изыскания, дендроплан.	с «31» июля 2017г. по «06» августа 2017г.	
Сдача 1 этапа заказчика	с «07» августа 2017г. по «13» августа 2017г.	
Прохождение комиссии по приемке изысканий в ДДС МО.	с «14» августа 2017г. по «20» августа 2017г.	
Согласование геоподосновы, завершение формирования отчета по ИГ	с «21» августа 2017г. по «27» августа 2017г.	
Выпуск отчета о инженерно-геологических изысканиях	с «28» августа 2017г. по «03» сентября 2017г.	
Согласование геодезии	с «04» сентября 2017г. по «10» сентября 2017г.	
Получение подписанного акта по этапу № 1	с «11» сентября 2017г. по «17» сентября 2017г.	
Разработка переустройства инженерных коммуникаций. Получение подтверждения Мосавтодор о возможности присоединения НО в счет ранее выданной мощности.	с «18» сентября 2017г. по «24» сентября 2017г.	
Проведение внутреннего и внешнего техсовета, получение согласования плана от администрации г. Подольск.	с «25» сентября 2017г. по «01» октября 2017г.	
Подготовка и сдача томов по этапу № 2, актов сдачи-приемки выполненных работ. Контроль рассмотрения письма в ГУРБ МО по видеофиксации. Получение ТУ на переустройство ЛК в Мосавтодор.	с «02» октября 2017г. по «08» октября 2017г.	



Отчет по итогам работы за неделю

Управление выполнением установленных требований

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

Назад Печатать Фильтр ? Помощь

Коэффициент выполнения протокольных поручений:
 ● K=0 (< 70 %)
 ● K=0.7 (70 - 95 %)
 ● K=1 (95 - 100 %)
 ● K=1.3 (> 100 %)

Отчет по исполнительской дисциплине выполнения протокольных поручений по объекту Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход

ФИО СОТРУДНИКА	ПОРУЧЕНИЙ ЗА ПЕРИОД	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО В СРОК	ПРОСРОЧЕНО	НЕ ВЫПОЛНЕНО	ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ (%)
Балькина Светлана Владимировна	1				1	0
Баскаков Антон Юрьевич	5	5		5		100
Гармашов Роман Анатольевич	3	3	1	2		100
Глазюв Ярослав Андреевич	2	2		2		100
Гусев Александр Владимирович	1	1		1		100
Ковач Алексей	3	3	2	1		100
Комляков Сергей Сергеевич	1	1		1		100
Лапицкая Юлия Александровна	3				3	0
Молоков Александр Владимирович	1	1		1		100
Передков Антон Владимирович	36	31	11	20	5	86
Савченко Юрий Васильевич	1	1	1			100
Сафонов Юрий Алексеевич	9	9	2	7		100
Теодоронская Маргарита Владимировна	1	1		1		100
Ткаченко Сергей Юрьевич	5	4	1	3	1	80
Итого:	72		18	44	10	

 Контроль исполнительской дисциплины участников команды

Управление выполнением установленных требований

Свернуть меню

Уведомления

Поиск Обновить

Входящие (23)

- Re: Пример видеокурса сегодня в 16:59
- Re: Информация сегодня в 11:31 [Жуковский, Туполева ул., рек-ция (РД)]Согласование от 15 октября 2018г., 22:30
- [Согласование задачи](#)
- [Важно][Жуковский, Туполева ул., рек-ция (РД)]порядок от 15 октября 2018г., 19:15
- Корректировка в графике от 15 октября 2018г., 17:14

Новости

Протокольные решения на контроле

Невыполненные протокольные решения

Невыполненные работы объектного графика

Объекты

Задачи

Свидетельства и сертификаты

Делопроизводство

Должностные лица

Мои контакты

Субподрядные организации

Согласующие организации

Заказчики

Договоры

Справочные файлы

Архив

BTM Сообщения Рабочая зона Закупки Предварительная работа с Заказчиком Объект Информация

Информация о ходе выполнения работ по получению ИРД Результаты по сбору исходных данных

Печатать
Фильтр
Создать форму СИД
15
Редактировать
Справочник наименований
Справочник организаций

Условные обозначения: ● Выполнено ● Требуется внимания ● Риск нарушения сроков

Регистрационная форма результатов работ по разделу "Сбор исходных данных" по объекту Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА / ДОКУМЕНТА / ЗАПРОСА / СПРАВКИ / ВИД УСЛУГ	НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТА ЗАПРОСА	НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТА ОТВЕТА НА ЗАПРОС	ОРГАНИЗАЦИЯ	СТАТУС	ОФИЦИАЛЬНЫЙ СРОК РАССМОТРЕНИЯ (ДНЕЙ)
▼ Старосимферопольское шоссе, пешеходный переход					
Заключение об отсутствии в зоне предполагаемого строительства объекта особо охраняемых территорий федерального значения	✓	✓	Министерство природных ресурсов и экологии РФ	В работе	70
Заключение об отсутствии в зоне предполагаемого строительства объекта особо охраняемых природных территорий регионального значения	✓	✓	Министерство экологии и природопользования	В работе	30
Заключение об отсутствии в зоне предполагаемого строительства объекта особо охраняемых пр местного значения	✓	✓	Органы местного самоуправления	В работе	30
Сведения о наличии					
ИТОГО: 1					

- Редактировать
- Просмотр документов**
- Просмотр прикрепленных графических документов
- Прикрепить документ
- Уведомить о получении документов
- Отправить документ по электронной почте



Чек-листы

Управление выполнением установленных требований

Свернуть меню

- Уведомления
- Новости
- Невыполненные протокольные решения
- Невыполненные работы объектного графика
- Объекты
- Задачи
- Свидетельства и сертификаты
- Делопроизводство
- Должностные лица
- Мои контакты
- Субподрядные организации
- Согласующие организации
- Заказчики
- Договоры
- Справочные файлы
- Архив

Поиск

\\SERVER-GNRL\Архив

[Обновить](#)

- Электронный архив организации
- Тома, переданные на хранение в архив структурного подразделения
- Тома, переданные на хранение в архив организации**
- Планируемая передача материалов в архив
- Дела, переданные на хранение в архив структурного подразделения
- Дела, переданные в архив организации
- Таблица кодов подразделения

ВТМ | Сообщения | Рабочая зона | Закупки | Предварительная работа с Заказчиком | Объект | Информация | Субподрядные работы | [Лапицкая Ю. А.](#) | [Выход](#)

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)

Печатать | | Наименование организации | | Добавить | Раскрыть все пункты | Свернуть все пункты

Материалы томов, переданные на хранение в архив организации

ОБЪЕКТ	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ МАТЕРИАЛ
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 131/15-Р-ПИР-2-ИИ	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 131/15-Р-ПИР-2-ИГ	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Книга 1. Пояснительная записка. 131/15-Р-ПИР-2-ИЭ1	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Книга 2. Приложения. 131/15-Р-ПИР-2-ИЭ2	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 131/15-Р-ПИР-2-ИГМИ	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
1 Общая пояснительная записка 131/15-Р-ПИР-2-ПЗ	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
2 Проект полосы отвода 131/15-Р-ПИР-2-ППО	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
3.1.1 Часть 1. Автомобильная дорога Основные проектные решения. 131/15-Р-ПИР-2-ТКР1.1	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
3.1.2 Часть 2. Автомобильная дорога. Чертежи и ведомости 131/15-Р-ПИР-2-ТКР1.2	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
3.1.3 Часть 3. Организация дорожного движения на период эксплуатации 131/15-Р-ПИР-2-ТКР1.3	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
4 Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта 131/15-Р-ПИР-2-ИЛО	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
5.1 Часть 1. Проект организации строительства 131/15-Р-ПИР-2-ПОС1	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
5.2 Часть 2. Проект организации дорожного движения на период производства работ 131/15-Р-ПИР-2-ПОС2	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
5.3 Часть 3. Временный светофорный объект на период производства работ 131/15-Р-ПИР-2-ПОС3	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
7.1 Часть 1. Пояснительная записка 131/15-Р-ПИР-2-ООС1	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
7.2 Часть 2. Приложения 131/15-Р-ПИР-2-ООС2	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 131/15-Р-ПИР-2-ПБ	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
9.1 Часть 1. Сводный сметный расчет 131/15-Р-ПИР-2-ССР	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
9.2.1 Книга 1. Подготовительные работы 131/15-Р-ПИР-2-СМ2.1	ООО "ВТМ дорпроект СТОЛИЦА"	
Итого: 48		





Архив проектной документации

Базы данных

ВТМ
Сообщения
Рабочая зона
Закупки
Предварительная работа с Заказчиком
Объект
Информация
Субподрядные работы
Лапицкая Ю. А.
Выход

Панель управления (для сворачивания/разворачивания нажмите alt+1 или кликните на заголовок)


[Печатать](#)


[Просмотреть удаленные записи](#)

Оценка сотрудничества ★ Рекомендовано к сотрудничеству ★ Сотрудничество не целесообразно ☆ Сотрудничали, отзывы нейтральные

Согласующие организации

	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА	ТЕЛЕФОНЫ	АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
	ГУП МО "Мособлгаз"	Ген.директор: Генеральный директ	(495) 5975555 многок анальный	info@mosoblqaz.ru
	Управление спецтелекоммуникаций Московской зон	Ген.директор: Начальник Борис Але		
	ОАО "Одинцовский Водоканал"	Ген.директор: Виталий Васильевич	(495) 593-2903	
	ПАО "МОЭСК"	Ген.директор: Синютин Петр Алекс	Единый контактный центр 8 (800) 700-40-	
	ОАО "Ростелеком"		(499) 199-0871 Заместитель директор Мо	
	ОАО "ВымпелКом" (Билайн) (ООО "Совинтел")	Ген.директор: Кудряшов Антон Влад	495 2587424	
	ЗАО "Синтерра"		(495) 647-77-77	
	ЗАО "МЦ НТТ" (ОАО "Ростелеком)	Ген.директор: Технический директо	(499) 550- 0000 Клавдия 8 499 550 13 25 <	
	ОАО "Комкор"	Ген.директор: Генеральный директ	(495) 411-7171 Факс: (495) 411-7151	info@akado-telecom.ru
	ООО "ВОЛСстрой" (ООО "ВолсИнвестТел")		721-1397 721-7272 (факс) Факс: 721-7272	info@volsstroy.ru
	ОАО "КОМСТАР-ОТС"		(495) 911-7151 Факс: (495) 9116569	
	ОАО "Центральный телеграф"	Ген.директор: Директор ДТЭ Шерем	495 5044426 89165222926 ММЮ Факс: 49	mikhail.minarev@ct.cnt
	ЗАО "ФОРТЭКС"		(495) 992-1511 Факс: (495) 992-1503	mail@fortex.ru
	АО "Воентелеком"	Ген.директор: А.Е. Давыдов	(495) 609-2005 Диспетчер (подача заявок	info@voentelecom.ru
	Управление АСУ и СДТУ ОАО «Мосэнерго»	Ген.директор: Начальник управлен	(495) 957 1 957 (4769)	
	ООО "Альфа Нет Телеком"		(495) 940-9211	mail@a-n-t.ru
	ОАО "МСС"		(495) 778-2002 Факс: (495) 971-9606	info@skvlink.msk.ru
	ООО "Телеком ТЭ"		495 7470000 Факс: (495) 748 0990	info@tz.ru
	ООО "МСК 910.py"	Ген.директор: Роман Анатольевич М	(495) 604-1916	
	ООО "Юр-тел" (ООО «ГорКом» Московский филиал)		(495) 788-9203 Руководитель Севолдаев I	

Свернуть меню


- Уведомления
- Новости
- Невыполненные протокольные решения
- Невыполненные работы объектного графика
- Объекты
- Задачи
- Свидетельства и сертификаты
- Делопроизводство
- Должностные лица
- Мои контакты
- Субподрядные организации
- Согласующие организации

Поиск


Обновить

- Все организации
 - Согласующие
 - Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
 - ЗАО "ВЕКТОРСТРОЙФИНАНС"
 - МП "Инжтехсервис"
 - МЦТЭТ г. Одинцово Московского филиала ОАО "Ростелеком"
 - СМУ-161 ОАО «Трансинжстрой» филиала ОАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго»
 - "Газпромбанк" (Акционерное общество)
- Заказчики
- Договоры
- Справочные файлы
- Архив

Цифровые технологии в проектировании и строительстве

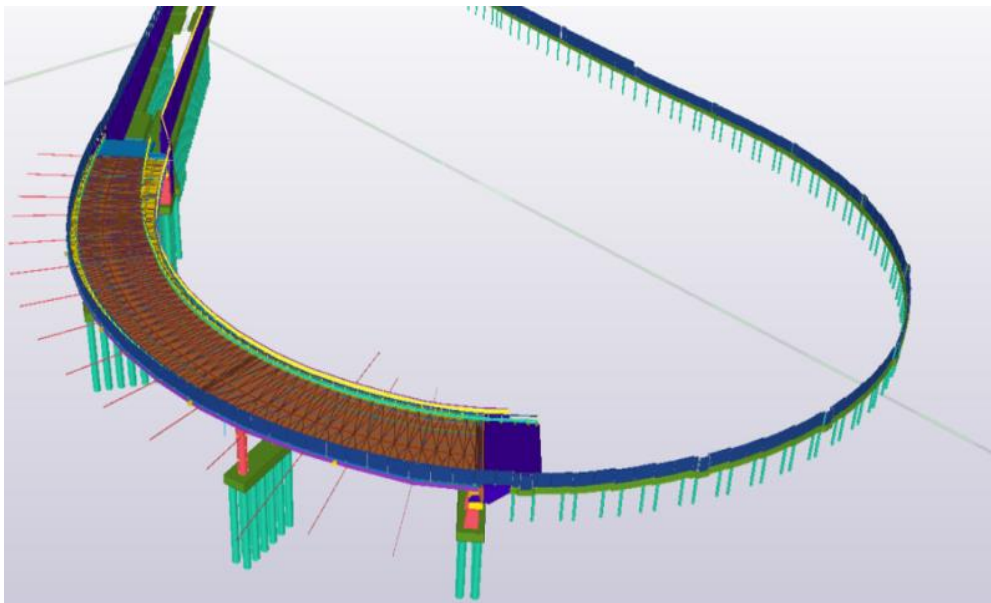

Лазерное сканирование

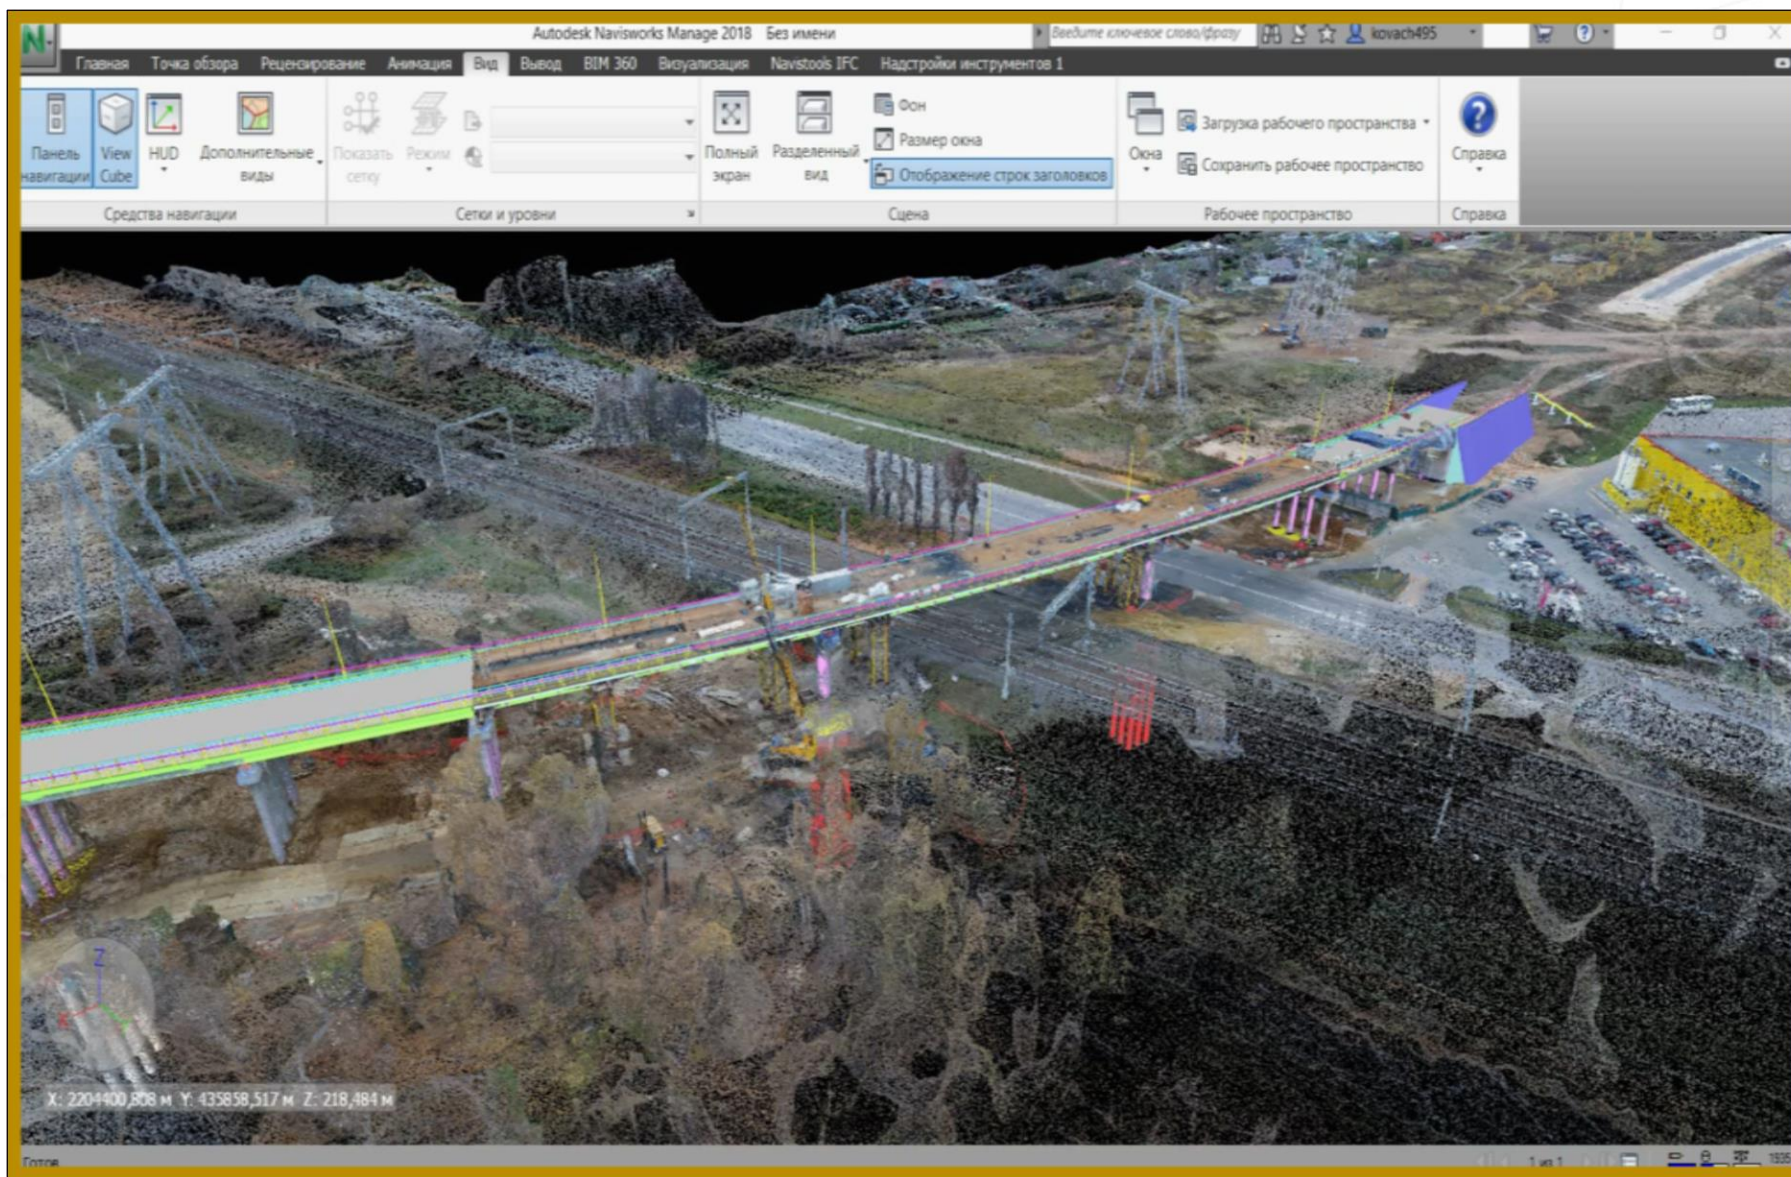

Специализированное программное обеспечение

Расчётные Системы

Иностранное ПО	Российское ПО
Лира-САПР	Лира-СОФТ
Plaxis 2D, 3D	Нет аналога (Geowall для простых задач)
Midas GTS	Нет аналога
Midas Civil	Лира-СОФТ
Sofistik	Лира-СОФТ

Система автоматизированного проектирования и черчения

Иностранное ПО	Российское ПО
AutoCAD	NanoCAD
Civil 3D	Топоматик Робур IndorCAD



Программное обеспечение по информационному моделированию




Иностранное	Отечественное
Allplan	Renga (частично)
Autodesk Civil	Топоматик Robur, InorCAD (частично)
Autodesk Revit	Связка Renga, NanoCAD, GeoniCS (частично)
Autodesk Infracore	indorCAD (частично)
Autodesk Navisworks	С-инфо, PilotBIM, CADlib
Tekla	Renga (частично)
Bentley	Renga (частично)



Автоматизация рутинных процессов

DYNAMO STUDIO



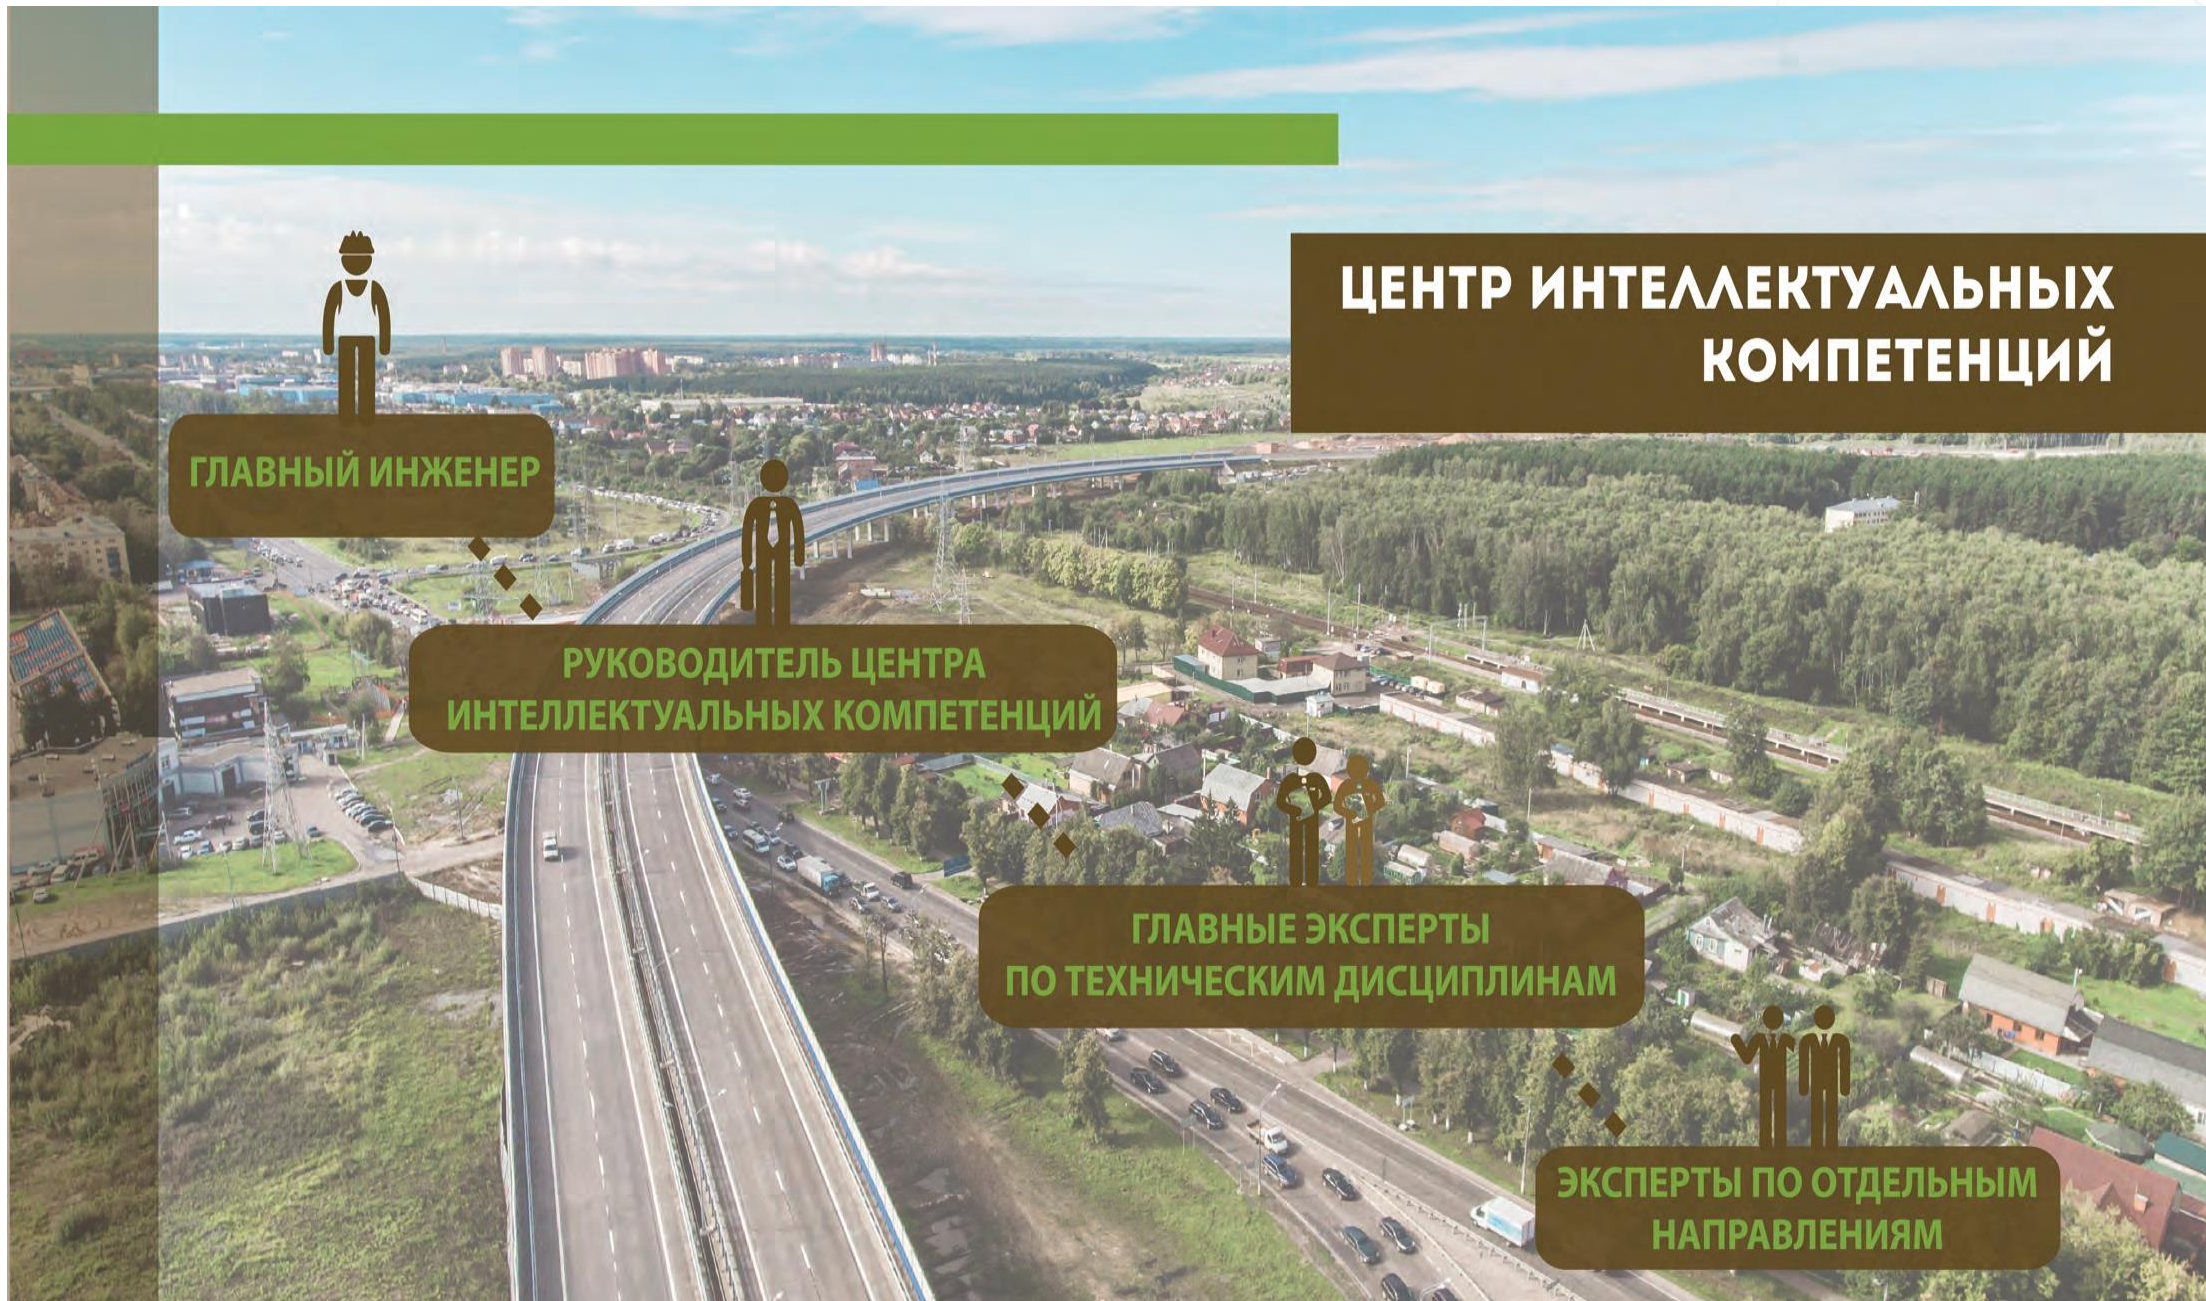

ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

ГЛАВНЫЕ ЭКСПЕРТЫ
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

ЭКСПЕРТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

**ИСТОЧНИКИ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ:**

РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНСТИТУТЫ

**НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ**



АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕХНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ СООРУЖЕНИЯ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВ СИСТЕМЫ**

**ПОИСК РЕШЕНИЯ, УЛУЧШАЮЩЕГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ**

**ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ И ЗАЩИТА
НА ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ**

ВНЕСЕНИЕ В БАЗУ ДАННЫХ

ПРИМЕНЕНИЕ В РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

An aerial photograph of a city, likely Moscow, showing a large, multi-level highway interchange in the foreground. The interchange has several ramps and lanes with cars and trucks. In the background, there are numerous residential apartment buildings of various heights, interspersed with green trees. A river or canal is visible in the middle ground. The entire scene is framed by a white dashed border that follows the top and sides of the image.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
